

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน

รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ทั้งเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๐)				
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินตาม ข้อบัญญัติ	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด ๒ ช่อง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๙,๖๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กย่านชุมชน (รางตัวยู) หมู่ที่ ๑๕	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๑๐	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บริเวณ ที่ทำการ อบต.แม่ฮ้อ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๕	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘	๒๐๔,๙๐๐	๑๙๓,๐๘๔	กองช่าง
๖	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านดงชัย (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	๒,๖๕๖,๐๐๐	๒,๖๕๖,๐๐๐	กองช่าง
๗	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านแม่แก้วใต้ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	๒,๖๕๔,๐๐๐	๒,๖๕๔,๐๐๐	กองช่าง
๖	โครงการขยายเขตบริการไฟฟ้า ม.๕	๒๐๐,๐๐๐	๔๙,๔๒๕.๗๗	กองช่าง
๗	โครงการขยายเขตบริการไฟฟ้าและติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) (ชอยป่าสุสาน) ม.๑๓	๖๐,๐๐๐	๕๘,๑๗๙.๕๒	กองช่าง
๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในหมู่บ้านโป่งทะลาย หมู่ที่ ๔	๑๔๙,๐๐๐	๑๔๖,๕๖๐.๘๑	กองช่าง
๙	ค่าสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อรองรับการเจาะบ่อ บาดาล หมู่ที่ ๑๘	๕,๔๐๐	๕,๔๐๐	กองช่าง
	รวมทั้งสิ้น	๗,๑๒๔,๓๐๐	๖,๙๕๖,๒๕๐.๑๐	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.แม่ฮ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐)





๑. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด ๒ ช่อง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗

งบประมาณตั้งไว้ ๑๗๐,๐๐๐ บาท

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน และยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการ สาธารณะ การสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ แนวทางการพัฒนาด้านประปา ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและ บริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) กำหนดไว้ในปี ๒๕๖๐ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และนำไปตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา ท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติฯ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงิน งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

จากการติดตามประเมินผล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ ได้ว่าจ้างและทำสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พีการช่าง ๖๖ โดยตกลงจ้างในราคา ๑๖๙,๖๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔๐๐ บาท กำหนดวันเริ่มทำงานวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ กำหนดวันส่ง มอบงานจ้างวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้าน ซึ่ง กำหนดผลลัพธ์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับว่า สามารถแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังภายในหมู่บ้านได้ จากการตรวจสอบ เอกสารที่เกี่ยวข้องและสถานที่ก่อสร้าง พบว่า การดำเนินการของผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างยังไม่สิ้นสุด สัญญาจ้าง

ภาพถ่ายขณะดำเนินการก่อสร้าง

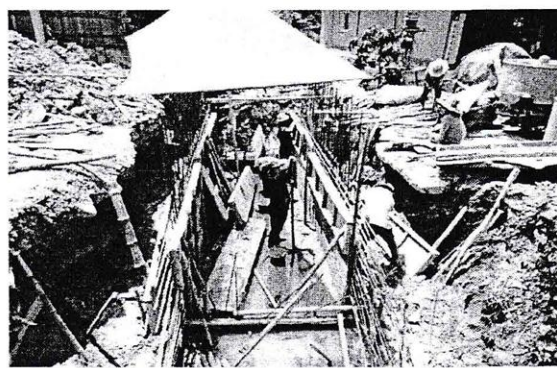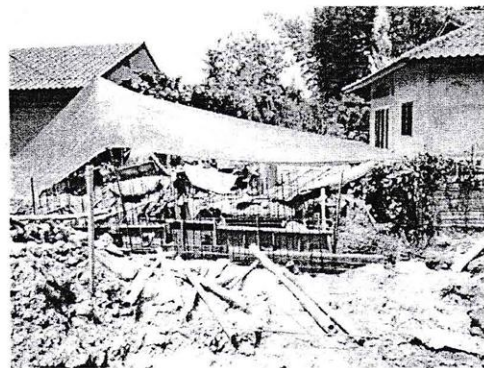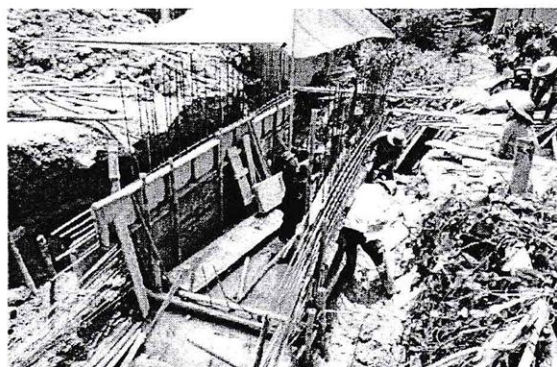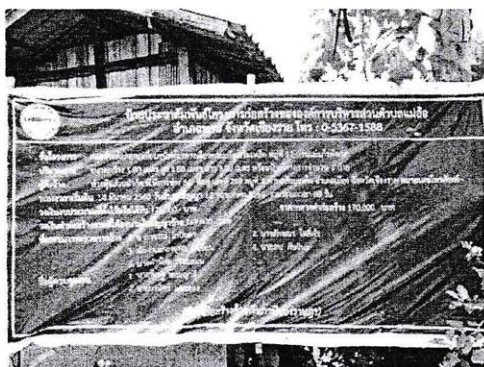

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.แม่ฮ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐)

๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน (รางตัวยู) หมู่ที่ ๑๕)

งบประมาณตั้งไว้ ๒๓๕,๐๐๐ บาท


ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน และยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการ สาธารณะ การสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ แนวทางการพัฒนาด้านประปา ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและ บริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) กำหนดไว้ในปี ๒๕๖๐ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท และนำไปตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒๓๕,๐๐๐ บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุก ประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติฯ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ

จากการติดตามประเมินผล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ ได้ว่าจ้างและทำสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เคที สโตน โดยตกลงจ้างในราคา ๒๓๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กำหนดวันเริ่มทำงานวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ กำหนดวันส่งมอบงานจ้างวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้าน ซึ่งกำหนดผลลัพธ์หรือ ผลที่คาดว่าจะได้รับว่า สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านได้ จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องและ สถานที่ก่อสร้าง พบว่า การดำเนินการของผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ และ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจผลงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งอยู่ใน ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออจึงได้เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างจำนวนทั้งสิ้น ๒๓๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ภาพถ่ายขณะดำเนินการก่อสร้าง



ภาพถ่ายดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย

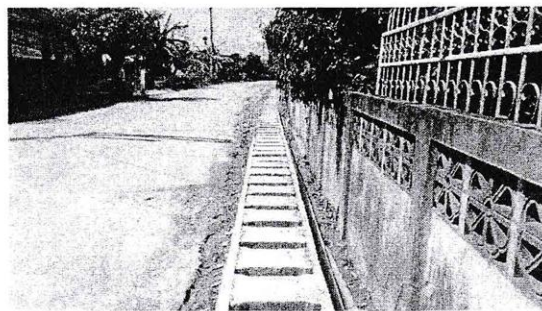


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.แม่่ออ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐)

๓. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณตั้งไว้ ๔๙๐,๐๐๐ บาท

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน และยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการ สาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ แนวทางการพัฒนาด้านประปา ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและ บริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) กำหนดไว้ในปี ๒๕๖๐ งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท และนำไปตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุก ประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติฯ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

จากการติดตามประเมินผล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ ได้ว่าจ้างและทำสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พีการช่าง ๖๖ โดยตกลงจ้างในราคา ๔๘๙,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๐๐ บาท กำหนดวันเริ่มทำงานวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กำหนดวันส่ง มอบงานจ้างวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน ม.๑๐ บ้านแม่แก้ว เหนือมีน้ำประปาที่สะอาดใช้ในการอุปโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง ซึ่งกำหนดผลลัพธ์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับว่า ประชาชน ม.๑๐ ร้อยละ ๖๐ มีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง จากการสอบถาม ประชาชนและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า ประชาชนหมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่แก้วเหนือมีน้ำประปาสำหรับการ อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง การดำเนินการของผู้นำจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ คือ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อจึงได้เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างจำนวนทั้งสิ้น ๔๘๙,๕๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ภาพถ่ายขณะดำเนินการก่อสร้าง

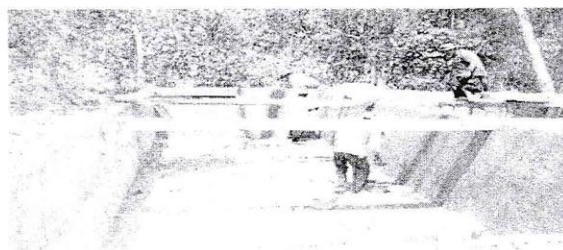

ภาพถ่ายดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.แม่ฮ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐)


๔. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บริเวณที่ทำการ อบต.แม่อ้อ งบประมาณตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน และยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการ สาธารณะ การสาธารณสุข โภค สาธารณูปการต่าง ๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์


จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์ เชื้อโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) กำหนดไว้ในปี ๒๕๖๐ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท และนำไปตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และ งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติฯ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

จากการติดตามประเมินผล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ได้ว่าจ้างและทำสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ กับบริษัท เดอะ โอเวอร์เลย์ จำกัด โดยตกลงจ้างในราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กำหนดวันเริ่มทำงานวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ กำหนดวันส่งมอบงานจ้างวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อมีที่จอดรถให้กับข้าราชการและประชาชนที่มาติดต่อ ราชการ ซึ่งกำหนดผลลัพธ์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับว่า อบต.แม่อ้อมีที่จอดรถยนต์สำหรับให้บริหารประชาชนและ พนักงาน จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องและสภาพพื้นที่จริง พบว่า การดำเนินการของผู้ว่าจ้างเมื่อถึงกำหนด ส่งมอบงานจ้างบริษัทดังกล่าว ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลา โดยได้ส่งมอบงานจ้างในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อได้หักค่าปรับทำงานเกินระยะเวลา จำนวน ๑ วัน วันละ ๓๐๐ บาท คงเหลือ จำนวนเงินเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างทั้งสิ้น ๒๙๙,๗๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ภาพถ่ายขณะดำเนินการก่อสร้าง

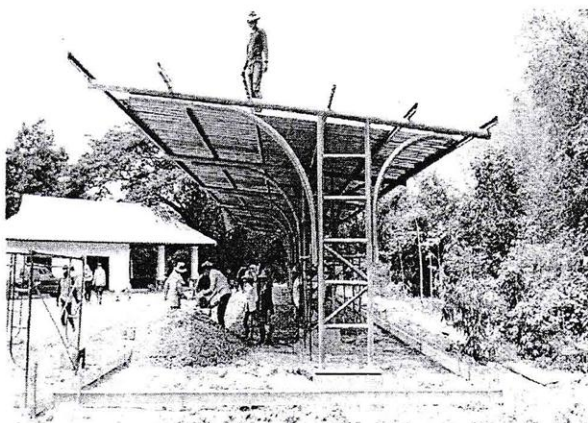

ภาพถ่ายดำเนินการแล้วเสร็จ

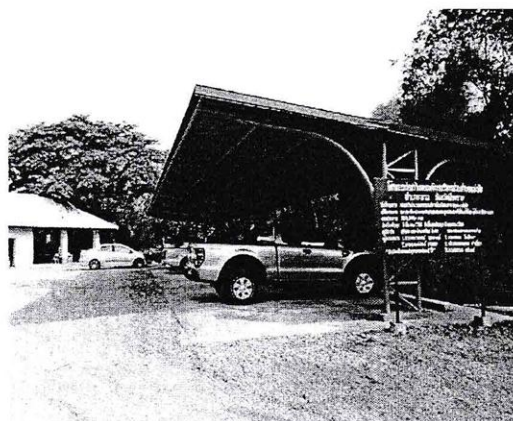


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.แม่อ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐)

๕. โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๔,๙๐๐ บาท

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน และยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการ สาธารณะ การสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ แนวทางการพัฒนาด้านประปา ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและ บริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) กำหนดไว้ในปี ๒๕๖๐ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท และนำไปตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒๐๔,๙๐๐ บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุก ประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติฯ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

จากการติดตามประเมินผล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ ได้ว่าจ้างและทำสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ กับร้านอาร์ แอนด์ เอ็ม บาดาล โดยตกลงจ้างในราคา ๑๙๓,๐๘๔ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๑,๘๑๖ บาท กำหนดวันเริ่มทำงานวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ กำหนดวันส่งมอบงาน จ้างวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน ม.๘ บ้านดงชัยมีน้ำประปาที่ สะอาดใช้ในการอุปโภคอย่างเพียงพอ ซึ่งกำหนดผลลัพธ์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับว่า ประชาชน ม.๘ ร้อยละ ๖๐ มีน้ำ สะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า ขณะ ดำเนินการติดตามประเมินผล ร้านอาร์ แอนด์ เอ็ม บาดาล ไม่ได้ส่งมอบงานตามกำหนดเวลาเนื่องจากการ ดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ จึงได้ทำหนังสือแจ้งค่าปรับผิดสัญญาต่อผู้รับจ้าง เรียบร้อยแล้ว หนังสือ ที่ ชร ๗๔๖๐๒/๓๓๙ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

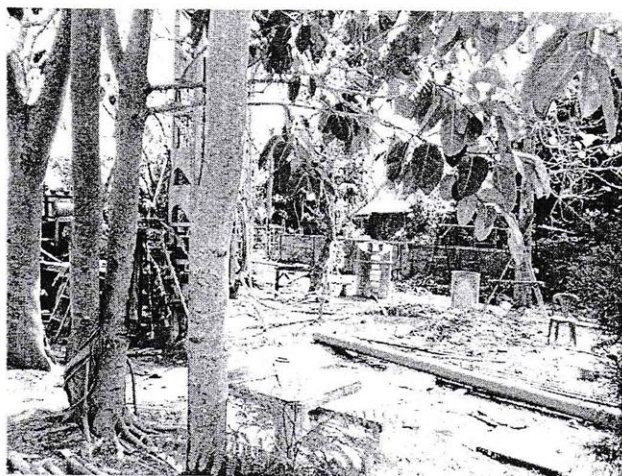


๖. ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านแม่แก้วใต้

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒,๖๕๔,๐๐๐ บาท

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน และยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการ สาธารณะ การสาธารณสุขโรค สาธารณูปการต่าง ๆ แนวทางการพัฒนาด้านประปา ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและ บริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) กำหนดไว้ในปี ๒๕๖๐ งบประมาณ ๓,๖๑๕,๘๐๐ บาท และได้รับการจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒,๖๕๔,๐๐๐ บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ

จากการติดตามประเมินผล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ ได้ว่าจ้างและทำสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ กับบริษัทผลวอเตอร์ จำกัด โดยตกลงจ้างในราคา ๒,๖๕๔,๐๐๐ บาท กำหนดวันเริ่มทำงานวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ กำหนดวันส่งมอบงานจ้างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน ม.๓ บ้านแม่แก้วใต้มีน้ำประปาที่สะอาดใช้ในการอุปโภคอย่าง เพียงพอและทั่วถึง ซึ่งกำหนดผลลัพธ์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับว่า ประชาชน ม.๓ ร้อยละ ๖๐ มีน้ำสะอาดสำหรับการ อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง จากการตรวจสอบสถานที่ดำเนินการก่อสร้างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า ขณะติดตามผลการดำเนินงานบริษัทผู้รับจ้างอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ภาพถ่ายขณะดำเนินการก่อสร้าง

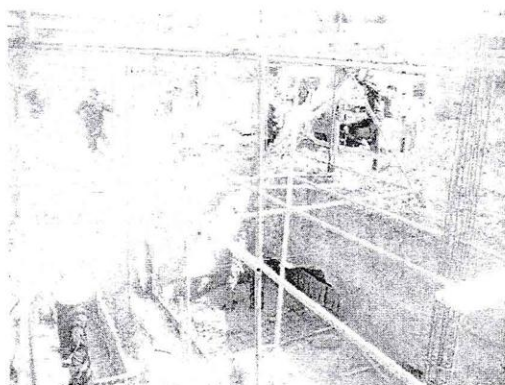


๗. ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านดงชัย

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒,๖๕๖,๐๐๐ บาท

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน และยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ แนวทางการพัฒนาด้านประปา ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) กำหนดไว้ในปี ๒๕๖๐ งบประมาณ ๓,๖๑๕,๘๐๐ บาท และได้รับการจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒,๖๕๖,๐๐๐ บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ

จากการติดตามประเมินผล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ ได้ว่าจ้างและทำสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ กับบริษัทผลวอเตอร์ จำกัด โดยตกลงจ้างในราคา ๒,๖๕๔,๐๐๐ บาท กำหนดวันเริ่มทำงานวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ กำหนดวันส่งมอบงานจ้างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน ม.๘ บ้านดงชัย มีน้ำประปาที่สะอาดใช้ในการอุปโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง ซึ่งกำหนดผลลัพธ์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับว่า ประชาชน ม.๘ ร้อยละ ๖๐ มีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง จากการตรวจสอบสถานที่ดำเนินการก่อสร้างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า ขณะติดตามผลการทำงานบริษัทผู้รับจ้างอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ภาพถ่ายขณะดำเนินการก่อสร้าง

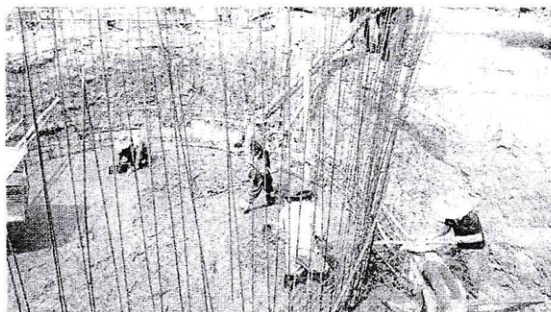

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.แม่่ออ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐)
